



**INSTITUTION ADOUR**  
Etablissement Public Territorial de Bassin  
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

# ***Programme d'actions de prévention des inondations de l'agglomération dacquoise***

***Comité de pilotage animation n°5 – 7 février 2024***



RÉGION  
**Nouvelle-Aquitaine**



UNION EUROPÉENNE

**La Nouvelle-Aquitaine et L'Europe**  
*agissent ensemble pour votre Territoire*



**MACS**  
Communauté de communes  
Maremne Adour Côte-Sud



Communauté de Communes  
du Pays Tarusate

**GRAND DAX**  
AGGLOMÉRATION

**TERRES DE CHALOSSE**  
communauté de communes



**PRÉFET  
DES LANDES**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# **1 - Bilan à mi-parcours**

# **2 - Bilan des actions menées en 2023 et perspectives pour 2024**



## AUGMENTATIONS DE BUDGETS DE CERTAINES ACTIONS

- ▮ Notamment des travaux sur le système d'endiguement dacquois

## AJOUT DE DEUX ACTIONS

- ▮ Réalisation des travaux de réduction de vulnérabilité prévus dans les diagnostics et étude d'un scénario supplémentaire sur la digue Maisonnave-RD10


## PROLONGATION DES DÉLAIS DU PAPI

- ▮ 3 ans d'animations supplémentaires : fin du PAPI prévue en septembre 2029



## AVANCEMENT DES 30 ACTIONS

■ En cours ■ Terminées ou sur le point de l'être ■ A engager

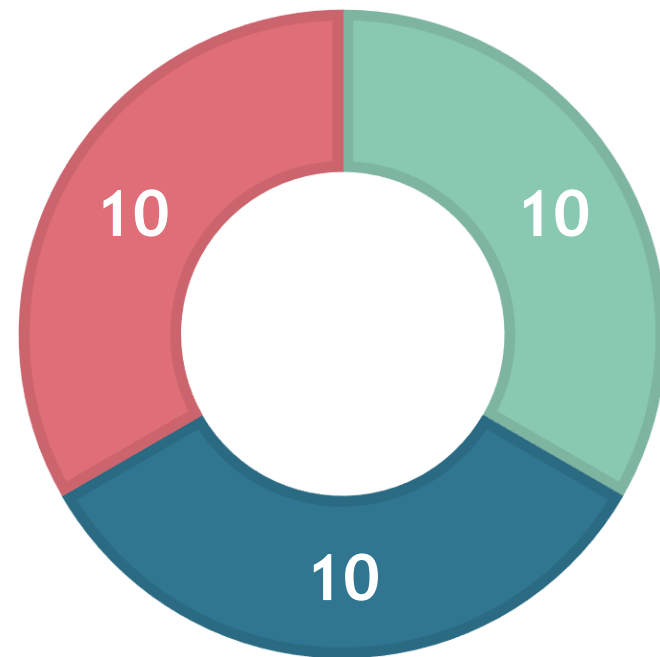

## AVANCEMENT DU BUDGET

	Engagé au 31/12/2023	Initialement prévu (pré-avenant)	Part consommée	Nouveau budget (post-avenant)	Part consommée
Animation	249 608 €	381 600 €	65%	616 508 €	40%
Axe 1	157 281 €	409 445 €	38%	432 762 €	36%
Axe 2	3 312 €	15 490 €	21%	7 356 €	45%
Axe 3	0 €	134 450 €	0%	48 000 €	0%
Axe 4	32 568 €	60 000 €	54%	32 460 €	100%
Axe 5	491 056 €	1 080 000 €	45%	1 880 000 €	26%
Axe 6	0 €	60 000 €	0%	60 000 €	0%
Axe 7	3 178 937 €	9 399 350 €	34%	15 000 000 €	21%
<b>Total</b>	<b>4 112 761 €</b>	<b>11 540 335 €</b>	<b>36%</b>	<b>18 077 086 €</b>	<b>23%</b>

**ACTIONS SENSIBILISATION**

**(1.1) Plateforme en ligne**

**2023**

- Site internet créé

<https://www.inondation-papi-dax.fr/>

**2024**

→ Validation par les locaux du contenu

→ Diffusion de l'information

**ACTIONS SENSIBILISATION** (1.5) Repères de crue

**2023**

- 16 repères fabriqués



**2024**

→ Pose des repères



**ACTIONS SENSIBILISATION**

**(1.6) Sensibilisation de la population**

**2023**

- 14 panneaux informatifs fabriqués
- Interventions auprès de 6 classes de collège
- Organisation de 2 ateliers Cit'in Crise




- Pose des panneaux
- Interventions en collège reconduites + préparation pour test en école primaire
- Cit'in Crise pour le grand public ?
- Projet de réalisation d'outils

**2024**

**AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE** (1.2) Recueil de données : étude de historique de l'Adour et ses affluents

2023

- Étude terminée sur la partie amont

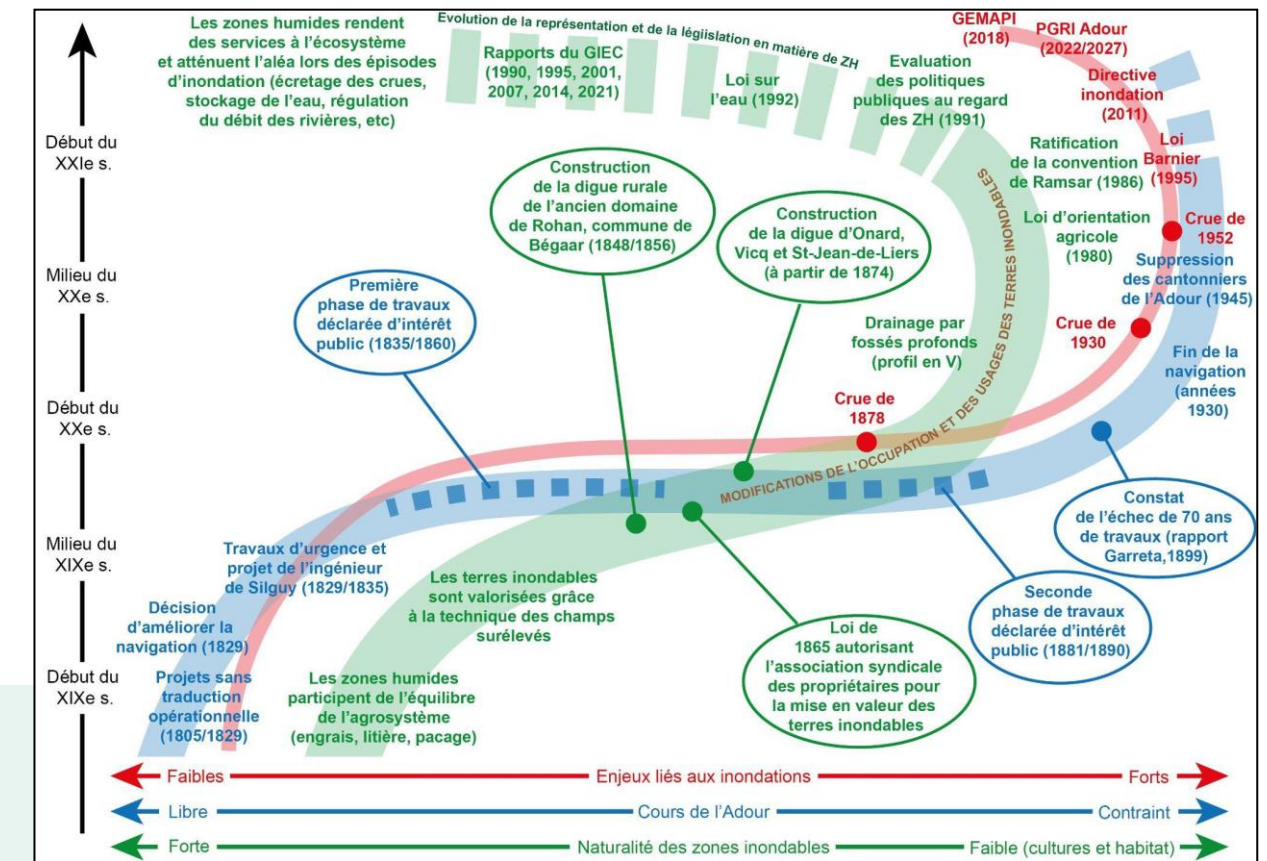

- ➔ Réalisation de la suite de l'étude
- ➔ Vulgarisation de la 1<sup>ère</sup> partie ?

2024



**AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE**

(1.3) Protocole post-crue

**2023**

- Journée de formation avec le SPC
- Pré-identification de points fixes
- Structure du protocole



**2024**

- Rédaction du protocole
- Achat des kits de collecteurs
- Test sur les crues de fin d'année



**AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE**

**(1.10) Scénario complémentaire sur l'ouvrage Maisonnave-RD10**

**2023**

- Réflexion sur suite étude d'ARTELIA
- Consultation pour scénario en plus  
↳ infructueux

**2024**

- Recherche de possibilités de financement des travaux pour Q2

**SURVEILLANCE DES CRUES** (2.2) Pose d'échelles limnimétriques

**2023**

- 5 échelles fabriquées



**2024**


→ Pose des échelles

**URBANISME**

(4.1) Prise en compte de l'inondation dans l'aménagement du territoire :  
AMITER sur le Sablar

**2023**

- Lancement d'une étude hydraulique / aménagement du territoire du quartier du Sablar

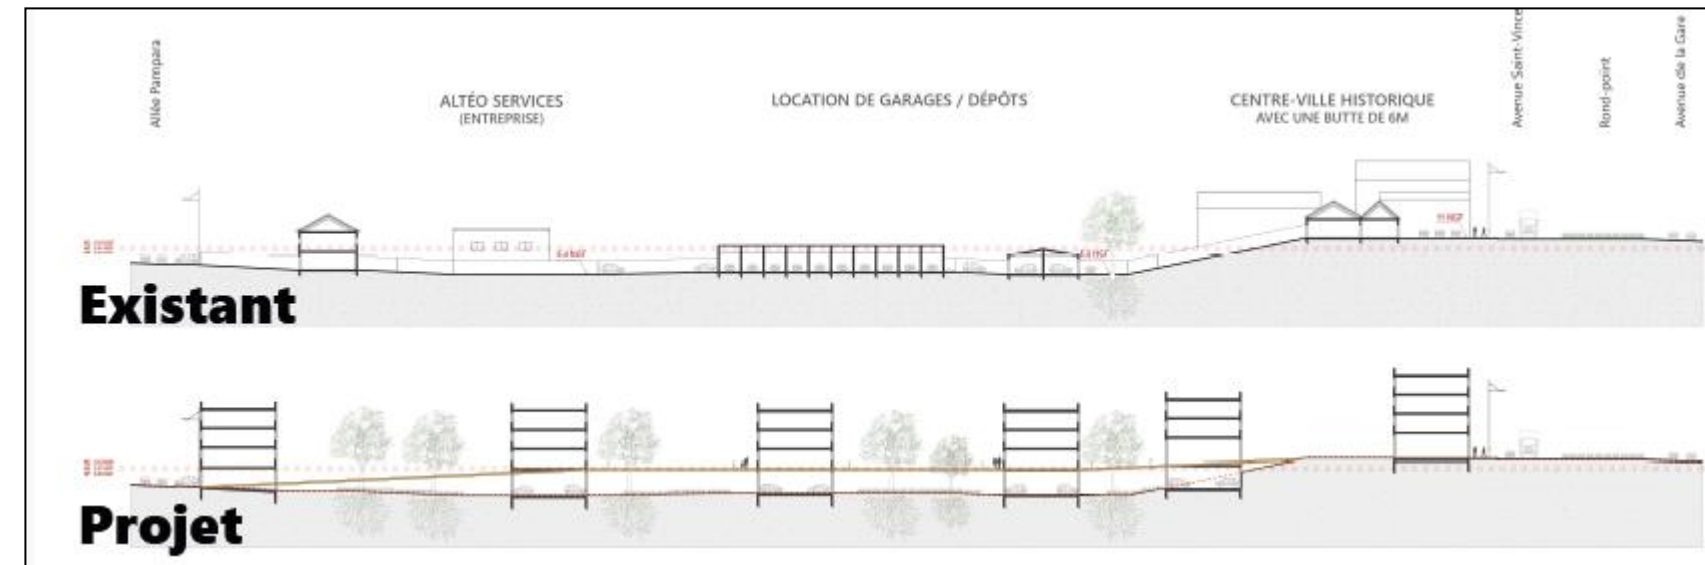

**2024**

→ Suite et fin de l'étude

## RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ

- (5.1) Réalisation de diagnostics de vulnérabilité
- (5.4) Réalisation des travaux de vulnérabilité

### 2023


PAPI : 15 diagnostics  
1 demande de travaux

MIRAPI : 65 diagnostics  
21 demandes de travaux

Total de 80 diagnostics pour 22  
demandes de travaux ( 27%)

### 2024

- Relance de la communication
- Fin du marché le 31/12
- Rappel aux propriétaires pour réaliser les travaux

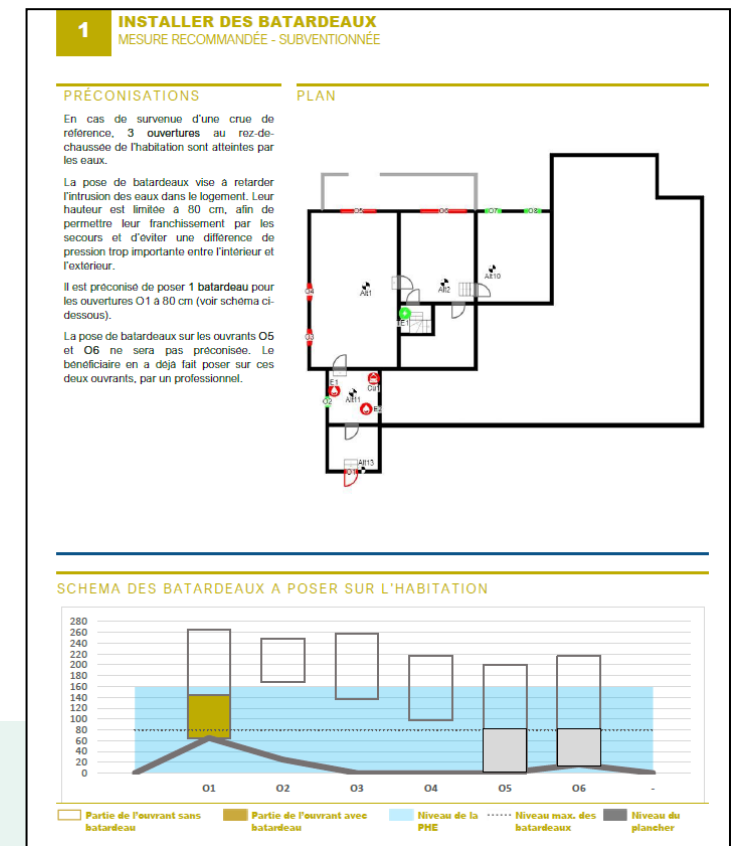

**OUVRAGES DE PROTECTION** (7.2) Travaux sur le système d'endiguement dacquois

**2023**

- Mise en place de palplanches au quartier de l'Estey
- AP de reconnaissance du SE le 06/12



- Construction d'un poste de relevage derrière l'hôpital
- Confortement des berges en rive droite
- Reprise de la digue de Boulogne

**2024**

## **GESTION DE CRISE**

- ▮ Annuaire de crise, amélioration de la communication, possibilité d'exercice...

## **PRÉPARATION DU LANCEMENT D'ÉTUDE POUR 2025**

- ▮ Dimensionnement de l'ouvrage de régulation du lac de Christus, méthodes douces pour lutter contre le ruissellement...

# Merci de votre attention

## Contact :

Anouck VOISIN  
Chargée de mission PAPI  
05 58 46 63 10  
tri.dax@institution-adour.fr

